



COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

PROVINCIA DI MATERA

REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE IN VIA SAN FRANCESCO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il Sindaco P.T.
Geom. Vincenzo ZITO

CAPOGRUPPO RTP





Dirigente area tecnica
Ing. P. NOBILE

DIRETTORE TECNICO
ing. Stefano Tranquilli
Progettista
ing. Stefano Tranquilli

Il R.U.P.
Ing. P. NOBILE


Visti/Protocolli



ing. Manuela D'Aguianno

Elaborato 19 :
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	02/08/2021	29/04/2022	270
2	B	Preparazione cantiere	03/08/2021	08/08/2021	5
3	C	Svellimento di basolato cordoni e zanelle	08/08/2021	07/10/2021	60
4	D	Demolizione marciapiedi	05/10/2021	04/11/2021	30
5	E	Opere idrauliche	03/11/2021	03/03/2022	120
6	F	Opere edili	04/01/2022	19/04/2022	105
7	G	Smobilizzo cantiere	20/04/2022	29/04/2022	9

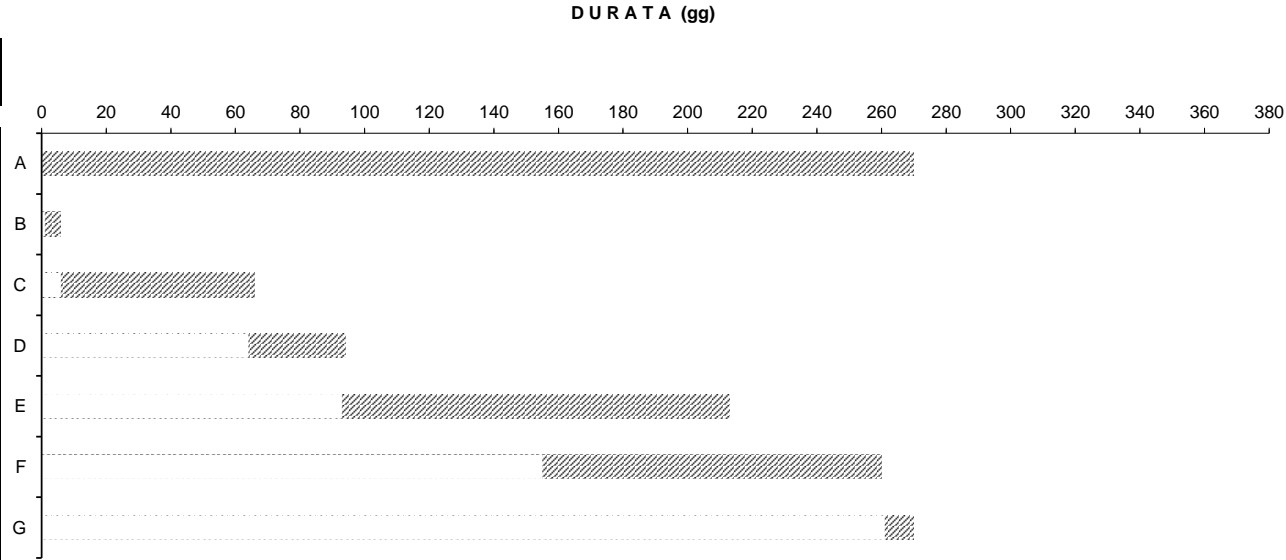

Inizio dei
lavori
02/08/2021

Fine lavori
29/04/2022

TC 270 gg. naturali consecutivi
