



COMUNE DI POMARICO

Provincia di Matera




Intervento di nuova costruzione per sostituzione dell'edificio adibito a scuola dell'infanzia A. Falotico

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento al Prezzario regionale Basilicata 2023

Finanziamento MIUR per la progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici - D.DDG n. 251 del 21 giugno 2019

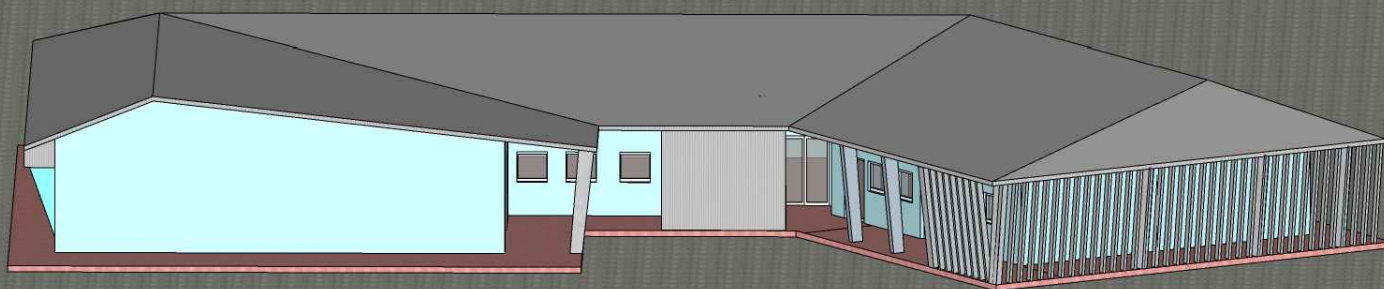

PROGETTISTA:

Ing. PAOLO MANCINI

COLLABORATORI:

Ing. ANGELO PERRONE
Ing. ANTONIO POPOLIZIO
Ing. RAFFAELE CALABRESE
Ing. ROBERTO GLIONNA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pierpaolo NOBILE

DATA	ELABORATO	PRELIM	DEFIN	ESEC	VAR
GIUGNO 2023					
	CRONOPROGRAMMA LAVORI	A.08			

ELENCO FASI LAVORAZIONI

FASI LAVORAZIONI	Durata giorni
Allestimento cantiere	5
Demolizione del fabbricato esistente	15
Scavo fondazioni	5
Realizzazione delle fondazioni in cemento	50
Riempimento fondazioni e getto massetto	10
Realizzazione carpenterie in cemento e legno	50
Realizzazione della copertura	35
Murature esterne e tramezzature	35
Predisposizione per impianti elettrici e idrici	25
Predisposizione per impianto termico	15
Formazione di intonaci per interni ed esterni	20
Realizzazione di pavimentazione e rivestimenti	30
Completamento impianti	15
Posa in opera degli infissi	15
Pitturazione interna ed esterna	25
Controllo e collaudo impianti	10
Smobilizzo cantiere	5
TOTALE	365

